



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
P.I. 01959230564  
**Numero Albo Artigiani (VT): 39708**  
www.piscinearrigoni.it  
[arrigoni@live.it](mailto:arrigoni@live.it)  
cell 320 32.89.415

**Spett. le**


.....  
.....  
Bolsena (VT)

**Oggetto:** Preventivo fornitura componenti piscina prefabbricata con pareti in acciaio

**Documento del:** 17/01/12

### **Caratteristiche principali piscina:**

- Dimensioni vasca:** come da disegno
- Perimetro totale:** 46,00
- Superficie specchio d'acqua:** 120,00 m<sup>2</sup>
- Superficie totale pareti, fondo, tramoggia, scala:** 181 m<sup>2</sup>
- Cubatura acqua:** 144,00 m<sup>3</sup> (circa)

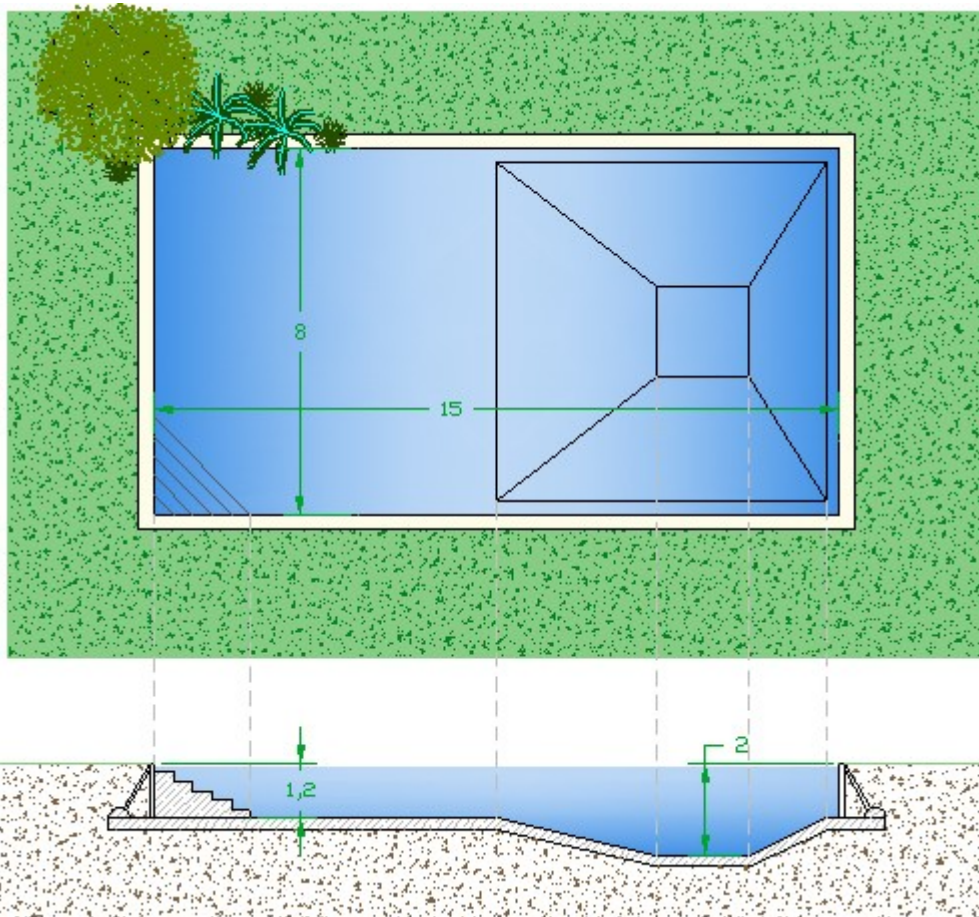



## Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia (grandezza filtro fino a piscine 256 mc) , elettropompa alta resa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer.

### Elenco materiale:

15788	Filtro Vesuvio 900 Ø - 32 mc/h - fino pisc. 256 mc	n°	1	€	860,49	€	860,49
00596	Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	415	€	0,48	€	197,72
07441	Valvola selettiva per controlavaggio da 2"	n°	1	€	112,58	€	112,58
	Raccordi per attacco valvola 2" a filtro 2" e 1/2	n°	1,00	€	17,15	€	17,15
38778	Pompa Victoria Plus HP 2 - trifase	n°	1	€	542,10	€	542,10
41941	Valvola a sfera 50 Ø	n°	9	€	19,10	€	171,86
41942	Valvola a sfera 63 Ø	n°	0	€	-	€	-
32588	Gomiti 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
32589	Gomiti 63 Ø	n°	30	€	1,95	€	58,60
32592	Te del 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
32593	Te del 63 Ø	n°	7	€	2,54	€	17,81
32603	Chivarda del 50 Ø x 1" e 1/2	n°	0	€	-	€	-
32604	Chivarda del 63 Ø x 2"	n°	3	€	5,03	€	15,09
02709	Tubo rigido PVC - 50 Ø	m	0	€	-	€	-
02710	Tubo rigido PVC - 63 Ø	m	4	€	2,42	€	9,68
01383	Tubo flessibile PVC - 50 Ø	m	0	€	-	€	-
32596	Bussola riduzione 63 x 50 Ø		9	€	0,83	€	7,46
26202	Adesivo extrarapido per PVC - confezione 500 cc	n°	3	€	11,62	€	34,85
28828	Solvente per PVC - confezione 1000 cc	n°	1	€	7,36	€	7,36
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	5	€	0,46	€	2,29
02136	Collari fissa tubi del 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
02137	Collari fissa tubi del 63 Ø	n°	20	€	0,73	€	14,67
25718	Quadro elettrico timer	n°	0	€	-	€	-
25724	Quadro elettrico timer e comando fari	n°	1	€	269,59	€	269,59
25726	Qua. Elett. timer, comando fari e salvavita	n°	0	€	-	€	-

Costo materiali	€	2.339,31
Manodopera		
TOTALE	€	2.339,31

## Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti che permettono il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina.

### Elenco materiale:



Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
01464	Skimmer bocca ampia	n°	4	€ 144,07	€ 576,30
00271	Presa di fondo	n°	1	€ 42,71	€ 42,71
00330	Bocchetta di mandata per liner	n°	4	€ 25,46	€ 101,84
15663	Passante a muro	n°	4	€ 7,76	€ 31,03
	Adattatore femmina 50 Ø x 1 e 1/2	n°	4	€ 3,44	€ 13,76
	Gomito 1 e 1/2 x 40 Ø per polietilene	n°	4	€ 2,42	€ 9,68
	Gomito 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	0	€ -	€ -
	Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 40 Ø per polietilene	n°	5	€ 2,27	€ 11,34
	Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	0	€ -	€ -
	Tubo polietilene 40 Ø - BD PN6	m	200	€ 2,22	€ 444,04
	Tubo polietilene 50 Ø - BD PN6	m	0	€ -	€ -
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	4	€ 0,46	€ 1,83
<hr/>					
Costo materiali				€	1.232,52
Manodopera					
TOTALE				€	1.232,52

## Illuminazione

La piscina è illuminata da fari a led (**no produzione cinese**). I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.

### Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
00364 ip41	Nicchia per faro standard o a led	n°	4	€ 57,01	€ 228,04
11279	Corpo faro alogeno da 300W.	n°	4	€ 99,77	€ 399,06
45619	Corpo faro a led colore	n°	0	€ -	€ -
32458	Pulsante cambio colore	n°	0	€ -	€ -
28138	Tubo flessibile collegamento faro a scatola	n°	4	€ 5,99	€ 23,97
00392	Scatola derivazione in ABS	n°	4	€ 21,41	€ 85,64
35385	Trasformatore di sicurezza con custodia 400 VA	n°	0	€ -	€ -
35386	Trasformatore di sicurezza con custodia 800 VA	n°	2	€ 205,82	€ 411,64
	Cavo elettrico unipolare 10 mmq	m	200	€ 0,39	€ 77,18
	Cavo elettrico unipolare 4 mmq	m	0	€ -	€ -
	Cavidotto 50 Ø	m	100	€ 1,12	€ 112,44
<hr/>					
Costo materiali				€	1.337,99
Manodopera					
TOTALE				€	1.337,99



## Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; **prodotto in Italia**. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto. Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

LINER

Codice	Descrizione articolo o intervento	Un.	Q.	P. unitario	Importo
	Manodopera posa per piscina rettangolare	mq	181	€ 9,78	€ 1.770,70
	Manodopera posa per piscina forma libera	mq	0	€ -	€ -
	Manodopera per rivestimento gradini	n°	5	€ 69,88	€ 349,39
	Liner 1,5 mm con armatura di rinforzo	mq	181	€ 25,16	€ 4.553,22
	Antisdrucchiolo per gradini	mq	4	€ 26,55	€ 106,21
05816	Profilo dritto alluminio	m	46	€ 9,99	€ 459,36
12504	Profilo pretagliato in alluminio per curve	m	0	€ -	€ -
	Chiodi espansione in alluminio	n°	100	€ 0,36	€ 36,21
	Colla fissaggio liner Flexcol - lit. 2,5	n°	1	€ 60,03	€ 60,03
	Doppio bordino PVC fissaggio liner al profilo	m	46	€ 1,22	€ 56,11
	Liquido sigillante	Kg	1	€ 28,59	€ 28,59

Costo materiali	€ 5.299,73
Manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.419,81</b>

## Pareti prefabbricate

Nuovi pannelli di acciaio zincato con lega resistente. Spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m.

**Elenco materiale:**

**Riepilogo dell'offerta:**



<b>Codice</b>	<b>Descrizione articolo</b>	<b>Un.</b>	<b>Q.</b>	<b>P. unitario</b>	<b>Importo</b>
01PA012	Pannello dritto h 1,2 x 2 acciaio zincato	n°	8	€ 148,14	€ 1.185,15
01PA013	Pannello dritto h 1,2 x 2,5 acciaio zincato	n°	12	€ 176,75	€ 2.121,02
01PFR105	Pannello preform raggio fisso h 1,2 x 1,5	n°	0	€ -	€ -
01PA015	Contrafforte	n°	16	€ 17,43	€ 278,86
01PA011	Pilastrino angolo retto h 1,2	n°	4	€ 26,89	€ 107,58
BU00218	Bulloni, dato, rondella	n°	210	€ 0,59	€ 123,26
PI00301	Pioli per fissaggio pannello	n°	76	€ 0,60	€ 45,62
F1000	Forature accessori	n°	12	€ 18,30	€ 219,63
	Trattamento anticorrosivo (lit. 2,5)	n°	3	€ 10,01	€ 30,02

Costo materiali	€ 4.111,14
Manodopera	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.111,14</b>

---

## Riepilogo dell'offerta:

### Locale tecnico

Costo materiali	€ 2.339,31
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.339,31</b>

### Riciclo

Costo materiali	€ 1.232,52
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.232,52</b>

### Illuminazione

Costo materiali	€ 1.337,99
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.337,99</b>

### Rivestimento in PVC rinforzato

Costo materiali	€ 5.299,73
Manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.419,81</b>



**Pareti prefabbricate**

Costo materiali	€ 4.111,14
Manodopera	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.111,14</b>

---

Totale materiale	€ 14.320,69
Totale manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>€ 16.440,78</b>

*I prezzi si intendono IVA esclusa*

---
