



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
P.I. 01959230564  
**Numero Albo Artigiani (VT): 39708**  
www.piscinearrigoni.it  
arrigoni@live.it

**Oggetto:** Preventivo fornitura e posa piscina con **pareti prefabbricate**

### **Caratteristiche principali piscina:**

**Dimensioni vasca:** come da disegno


**Perimetro totale:** 33,00

**Superficie specchio d'acqua:** 53,00 m<sup>2</sup>

**Superficie totale pareti, fondo, tramoggia, scala:** 97,6 m<sup>2</sup>

**Cubatura vasca:** 67,13 m<sup>3</sup>

**Cubatura acqua:** 62,00 m<sup>3</sup> (circa)

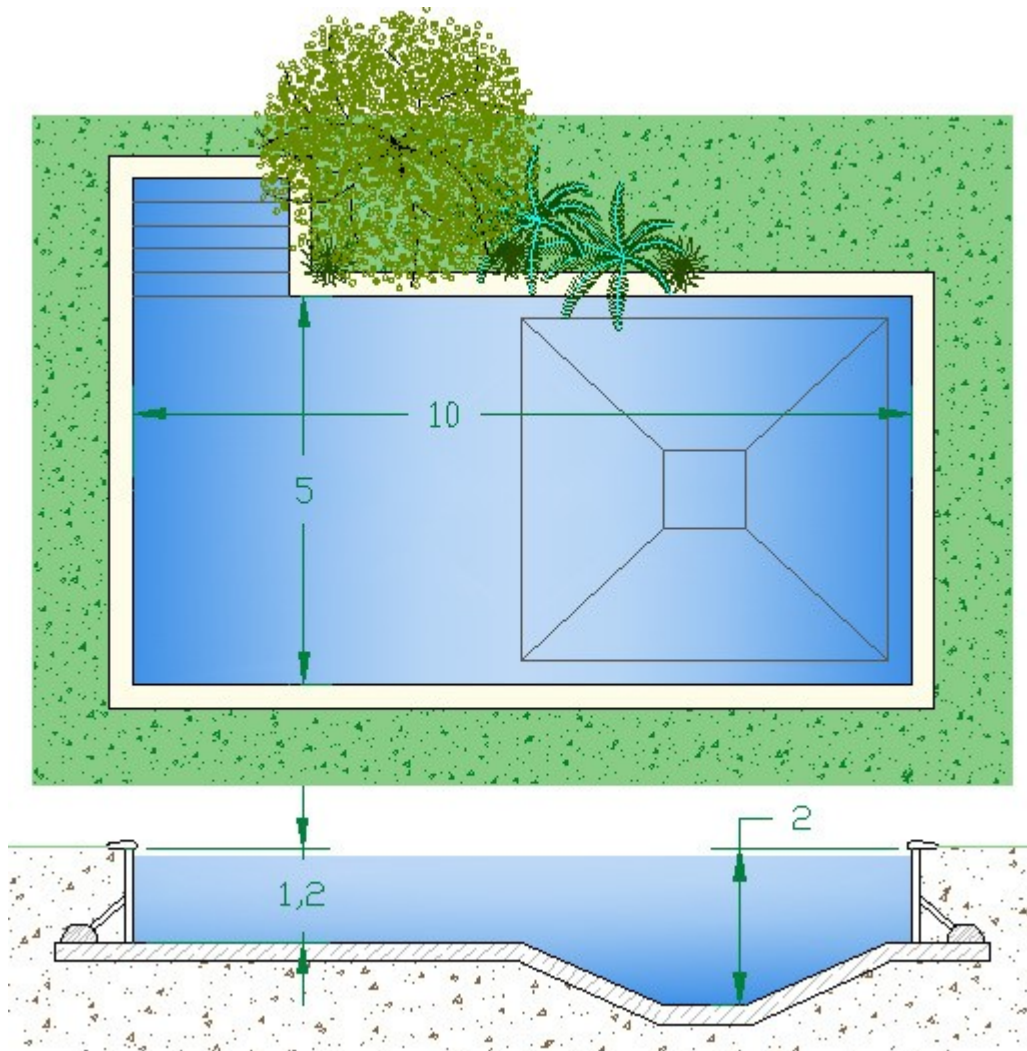



## Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, elettropompa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer.

### Elenco materiale:

| Codice | Descrizione articolo                            | Un. | Q.  | P. unitario | Importo  |
|--------|---|-----|-----|-------------|----------|
| 15486  | Filtro Vesuvio 600 Ø - 14 mc/h                  | n°  | 1   | € 442,32    | € 442,32 |
| 00596  | Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm                  | kg  | 150 | € 0,48      | € 71,47  |
| 34543  | Valvola selettiva per controlavaggio            | n°  | 1   | € 59,73     | € 59,73  |
| 38771  | Pompa Victoria Plus HP 3/4 con ampio prefiltro  | n°  | 1   | € 467,32    | € 467,32 |
| 41941  | Valvole a sfera 50 Ø                            | n°  | 5   | € 19,10     | € 95,48  |
| 41942  | Valvole a sfera 63 Ø                            | n°  | 0   | € -         | € -      |
| 32588  | Gomiti 50 Ø                                     | n°  | 10  | € 8,26      | € 82,61  |
| 32592  | Te del 50 Ø                                     | n°  | 3   | € 3,71      | € 11,12  |
| 32603  | Chivarda del 50 Ø x 1 e 1/2                     | n°  | 3   | € 6,17      | € 18,52  |
| 02709  | Tubo rigido PVC - 50 Ø                          | m   | 2   | € 3,17      | € 6,35   |
| 01383  | Tubo flessibile PVC - 50 Ø                      | m   | 0   | € -         | € -      |
| 26202  | Adesivo extrarapido per PVC - confezione 500 cc | n°  | 1   | € 11,62     | € 11,62  |
| 28828  | Solvente per PVC - confezione 1000 cc           | n°  | 1   | € 7,36      | € 7,36   |
| 14942  | Rotolo teflon 12 mm / 12 m                      | n°  | 5   | € 0,46      | € 2,29   |
| 02136  | Collari fissa tubi del 50 Ø                     | n°  | 4   | € 1,27      | € 5,07   |
| 25718  | Quadro elettrico timer                          | n°  | 0   | € -         | € -      |
| 25722  | Quadro elettrico timer e comando fari           | n°  | 1   | € 269,59    | € 269,59 |
| 25726  | Qua. Elett. timer, comando fari e salvavita     | n°  | 0   | € -         | € -      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Costo materiali | € 1.550,83        |
| Manodopera      | € 500,00          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 2.050,83</b> |

## Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti che permettono il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina. Tali dispositivi, come del resto tutti i restanti, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.

### Elenco materiale:



| Codice          | Descrizione articolo                               | Un. | Q.  | P. unitario | Importo  |
|-----------------|--|-----|-----|-------------|----------|
| 01464           | Skimmer bocca ampia                                | n°  | 2   | € 144,07    | € 288,15 |
| 00271           | Presa di fondo                                     | n°  | 1   | € 42,71     | € 42,71  |
| 15663           | Passante a muro                                    | n°  | 2   | € 7,76      | € 15,51  |
|                 | Adattatore femmina 50 Ø x 1 e 1/2                  | n°  | 2   | € 3,44      | € 6,88   |
|                 | Gomito 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene              | n°  | 2   | € 6,62      | € 13,24  |
|                 | Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene | n°  | 5   | € 5,96      | € 29,78  |
|                 | Tubo polietilene 50 Ø - BD PN6                     | m   | 100 | € 3,37      | € 337,32 |
| 14942           | Rotolo teflon 12 mm / 12 m                         | n°  | 3   | € 0,46      | € 1,37   |
| Costo materiali |  |     |     |             | € 734,96 |
| Manodopera      |  |     |     |             | € 250,00 |
| TOTALE          |  |     |     |             | € 984,96 |

## Illuminazione

La piscina è illuminata da **grandi** fari alogeni da **300 W** a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.

### Elenco materiale:

| Codice          | Descrizione articolo                           | Un. | Q.  | P. unitario | Importo  |
|-----------------|--|-----|-----|-------------|----------|
| 00364 ip41      | Nicchia per faro standard o a led              | n°  | 2   | € 57,01     | € 114,02 |
| 11279           | Corpo faro alogeno da 300W.                    | n°  | 2   | € 99,77     | € 199,53 |
| 28138           | Tubo flessibile collegamento faro a scatola    | n°  | 2   | € 5,99      | € 11,99  |
| 00392           | Scatola derivazione in ABS                     | n°  | 2   | € 21,41     | € 42,82  |
| 35386           | Trasformatore di sicurezza con custodia 800 VA | n°  | 1   | € 205,82    | € 205,82 |
|                 | Cavo elettrico unipolare 10 mmq                | m   | 100 | € 0,77      | € 77,18  |
|                 | Cavo elettrico unipolare 6 mmq                 | m   | 0   | € -         | € -      |
|                 | Cavo elettrico unipolare 4 mmq                 | m   | 0   | € -         | € -      |
|                 | Cavidotto 50 Ø                                 | m   | 50  | € 1,12      | € 56,22  |
| Costo materiali |  |     |     |             | € 707,59 |
| Manodopera      |  |     |     |             | € 250,00 |
| TOTALE          |  |     |     |             | € 957,59 |

## Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; **prodotto in Italia. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto.** Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

### Elenco materiale:



| Codice | Descrizione articolo o intervento             | Un. | Q.   | P. unitario | Importo                           |
|--------|---|-----|------|-------------|-----------------------------------|
|        | Manodopera posa per piscina rettangolare      | mq  | 97,6 | € 9,78      | € 954,81                          |
|        | Manodopera posa per piscina forma libera      | mq  | 0    | € -         | € -                               |
|        | Manodopera per rivestimento gradini           | n°  | 0    | € -         | € -                               |
|        | Liner 1,5 mm con armatura di rinforzo         | mq  | 97,6 | € 25,16     | € 2.455,22                        |
|        | Antisdruciolino per gradini                   | mq  | 4    | € 26,55     | € 106,21                          |
| 05816  | Profilo dritto alluminio                      | m   | 33   | € 9,99      | € 329,54                          |
| 12504  | Profilo pretagliato in alluminio per curve    | m   | 0    | € -         | € -                               |
|        | Chiodi espansione in alluminio                | n°  | 100  | € 0,36      | € 36,21                           |
|        | Colla fissaggio liner Flexcol - lit. 2,5      | n°  | 1    | € 60,03     | € 60,03                           |
|        | Doppio bordino PVC fissaggio liner al profilo | m   | 33   | € 1,22      | € 40,25                           |
|        | Liquido sigillante                            | Kg  | 1    | € 28,59     | € 28,59                           |
|        |   |     |      |             | <b>Costo materiali</b> € 3.056,05 |
|        |   |     |      |             | <b>Manodopera</b> € 954,81        |
|        |   |     |      |             | <b>TOTALE</b> € 4.010,85          |

## Pareti prefabbricate

Nuovi pannelli di acciaio zincato con lega più resistente. Spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m. La garanzia sulle pareti e le sue parti (contrafforti, bulloneria, ecc.) è **di 30 anni**.

### Elenco materiale:

| Codice   | Descrizione articolo                        | Un. | Q. | P. unitario | Importo                           |
|----------|---|-----|----|-------------|-----------------------------------|
| 01PA012  | Pannello dritto h 1,2 x 2 acciaio zincato   | n°  | 7  | € 148,14    | € 1.037,00                        |
| 01PA013  | Pannello dritto h 1,2 x 2,5 acciaio zincato | n°  | 8  | € 176,75    | € 1.414,01                        |
| 01PFR105 | Pannello preform raggio fisso h 1,2 x 1,5   | n°  | 0  | € -         | € -                               |
| 01PA015  | Contrafforte                                | n°  | 9  | € 17,43     | € 156,86                          |
| 01PA011  | Pilastrino angolo retto h 1,2               | n°  | 6  | € 26,89     | € 161,36                          |
| BU00218  | Bulloni, dato, rondella                     | n°  | 60 | € 0,59      | € 35,22                           |
| PI00301  | Pioli per fissaggio pannello                | n°  | 45 | € 0,60      | € 27,01                           |
| F1000    | Forature accessori                          | n°  | 6  | € 18,30     | € 109,82                          |
|          | Trattamento anticorrosivo (lit. 2,5)        | n°  | 1  | € 10,01     | € 10,01                           |
|          |   |     |    |             | <b>Costo materiali</b> € 2.951,30 |
|          |   |     |    |             | <b>Manodopera</b> € 750,00        |
|          |   |     |    |             | <b>TOTALE</b> € 3.701,30          |

## Attrezzatura per la pulizia

Sono semplici attrezzi utili alla pulizia del fondo e della superficie della piscina.

### Elenco materiale:



| Codice | Descrizione articolo                             | Un. | Q. | P. unitario     | Importo  |
|--------|--|-----|----|-----------------|----------|
| 01349  | Aspirafango articolato                           | n°  | 1  | € 28,97         | € 28,97  |
| 36615  | Spazzola di fondo Sahrk                          | n°  | 1  | € 10,63         | € 10,63  |
| 36614  | Retino di fondo Shark                            | n°  | 1  | € 13,82         | € 13,82  |
| 38423  | Manico telescopico Shark clip e viti - 2,4 ÷ 4,8 | n°  | 2  | € 36,32         | € 72,65  |
| 01375  | Tube galleggiante per aspirafango - 15 m         | n°  | 1  | € 51,78         | € 51,78  |
|        |  |     |    | Costo materiali | € 177,84 |
|        |  |     |    | Manodopera      |          |
|        |  |     |    | TOTALE          | € 177,84 |

## Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina.

### Elenco materiale:

| Codice    | Descrizione articolo                       | Un. | Q. | P. unitario     | Importo  |
|-----------|--|-----|----|-----------------|----------|
| 14647     | PoolTester cloro libero e pH               | n°  | 1  | € 25,82         | € 25,82  |
| 13775     | Ph Minor                                   | kg  | 25 | € 1,76          | € 43,95  |
| 16478     | Dicloro granulare                          | kg  | 10 | € 6,75          | € 67,49  |
| 1972      | Pastiglioni cloro da 500 gr                | kg  | 10 | € 9,59          | € 95,88  |
| 11388     | Flocculante liquido (confezioni da 5 lit.) | lit | 10 | € 3,89          | € 38,93  |
| LIT002066 | Antialga schirente                         | lit | 10 | € 3,31          | € 33,10  |
|           |  |     |    | Costo materiali | € 305,18 |
|           |  |     |    | Manodopera      |          |
|           |  |     |    | TOTALE          | € 305,18 |

### Riepilogo dell'offerta:

#### Locale tecnico

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Costo materiali | € 1.550,83 |
| Manodopera      | € 500,00   |
| TOTALE          | € 2.050,83 |

#### Riciclo

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Costo materiali | € 734,96 |
| Manodopera      | € 250,00 |
| TOTALE          | € 984,96 |



### **Illuminazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 707,59        |
| Manodopera      | € 250,00        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 957,59</b> |

### **Rivestimento in PVC rinforzato**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Costo materiali | € 3.056,05        |
| Manodopera      | € 954,81          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 4.010,85</b> |

### **Pareti prefabbricate**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Costo materiali | € 2.951,30        |
| Manodopera      | € 750,00          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 3.701,30</b> |

### **Accessori per la pulizia**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 177,84        |
| Manodopera      |                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 177,84</b> |

### **Prodotti chimici per l'avvio**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 305,18        |
| Manodopera      |                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 305,18</b> |

---

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Totale materiale    | € 9.483,75         |
| Totale manodopera   | € 2.704,81         |
| <b>TOTALE OPERA</b> | <b>€ 12.188,56</b> |

*I prezzi si intendono IVA esclusa*

---

## **Note sulla tipologia dei materiali:**

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, fari ecc. sono della ASTRALPOOL. Questa azienda è leader nel mercato italiano della componentistica per piscine pubbliche e private. **La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali per la distribuzione e l'assistenza in tutta Italia.**



Il liner in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti, può essere o dalla FLAG SPA prodotto in Italia, oppure della ASTRALPOOL

Gli altri componenti come tubazioni, raccordi, prodotti chimici ecc sono tutti a norma ed appartengono a produttori diversi.

---

## Sono a carico del cliente:

1. Gli scavi e il rinterro
  2. La realizzazione della base in cemento
  3. La realizzazione del massetto sulla base in cemento
  4. La costruzione della scalinata
  5. La rasatura della base in cemento e della scalinata
  6. La costruzione del vano che ospiterà il filtro e l'elettropompa
  7. La realizzazione dello scarico acqua dal vano filtro alla rete fognaria
  8. La gettata in calcestruzzo per il fissaggio dei contrafforti (reggispinta delle pareti)
  9. La fornitura di elettricità sotto salvavita fin dentro il locale tecnico
  10. La fornitura di linea di scarico a terra elettrico fin dentro il locale tecnico
  11. Una presa di acqua con valvola a sfera in prossimità della vasca, per riempimento piscina. (La piscina non dispone di sistemi automatici di ripristino livello acqua.)
  12. La costruzione del marciapiede perimetrale alla vasca
  13. Il bordo perimetrale (fornitura e posa)
  14. Tutte le opere in muratura
  15. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato
- 

## Recesso dal contratto:

**Il cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza l'onere di alcuna penale o costo aggiuntivo.** Resta chiaramente obbligato a saldare il materiale e il lavoro già fornito fino a quel momento. Al pari eventuali acconti versati, verranno conguagliati.
